



合格
盖章
不合格

(检修)

合格
盖章
不合格

(运维)

已执行
盖未执行章
作废

(运维)

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司
编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

1. 工作负责人(监护人)： 刘洪林 班组：检修一队, 杭州交联电气工程有限公司检修二队

2. 工作班成员(不包括工作负责人)：
胡涛, 郭伟伟, 罗国君, 朱利雄

共 4 人

3. 工作的变、配电站名称：
500kV永康变

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司

编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

4. 工作任务：

序号	工作地点及设备双重名称	工作内容
1	2号主变5021开关	永康变2号主变5021开关机构频繁打压缺陷处理。

5. 计划工作时间： 自 2024年08月03日05时30分 至 2024年08月04日17时00分

6. 安全措施(下列除注明的，均由工作票签发人填写，地线编号由许可人填写，工作许可和工作负责人共同确认后，已执行栏“√”)：

序号	应拉断路器(开关)、隔离开关(刀闸)		许可人确认	负责人确认
1	拉开2号主变5021开关、2号主变50211闸刀、2号主变50212闸刀		√	√
2	断开2号主变50211闸刀、2号主变50212闸刀操作电源及控制电源		√	√
序号	应装接地线、应合接地刀闸(注明地点、名称及接地线编号)*	接地线编号	许可人确认	负责人确认
1	合上2号主变502117接地闸刀		√	√
2	合上2号主变502127接地闸刀		√	√

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司

编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

序号	应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施*	许可人确认	负责人确认
1	在2号主变5021开关四周设置围栏，围栏上向内悬挂适量“止步，高压危险”标示牌，在工作地点放置“在此工作”标示牌，在围栏入口处设置“从此进出”标示牌；	√	√
2	在2号主变5021开关汇控柜内2号主变50211闸刀、2号主变50212闸刀操作电源及控制电源空开、就地操作把手、闸刀机构箱上悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。	√	√
序号	工作地点保留带电部分或注意事项(工作票签发人填写)	补充工作地点保留带电部分或安全措施(工作许可人填写)	
1	2号主变50211闸刀母线侧、2号主变50212闸刀主变侧带电；	已拉开2号主变50211闸刀、2号主变50212闸刀操作电源及控制电源空开；	
2	相邻2号主变/仙康线5022开关间隔，500kV第一串、第三串设备，2号主变500kV压变、避雷器带电运行；	已拉开2号主变5021开关第一套智能终端控制电源开关1-4DK3、2号主变5021开关第二套智能终端控制电源开关2-4DK3；	

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司
编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

3	相邻500kV I 母母线，2号主变500kV高层跨线带电运行；	在2号主变5021开关汇控柜内2号主变50211闸刀、2号主变50212闸刀操作电源及控制电源空开、就地操作把手、闸刀机构箱上已悬挂“禁止合闸、有人工作”标示牌。
4	工作中加强监护，进出工作地点及作业时应注意与带电部分保持足够的安全距离，人员： 500kV≥5.0米，220kV≥3.0米，35kV≥1.0米；	
5	检修工作时严防失去接地保护。	

工作票签发人签名： 项军 签发日期：2024年08月02日17时57分
工作票签发人签名： 陈亢 签发日期：2024年08月02日18时17分
7. 收到工作票时间：2024年08月02日19时50分 运行人员签名： 吴志坚
工作负责人签名： 刘洪林

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司
编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

8. 确认本工作票1-7项：

工作负责人签名： 刘洪林 工作许可人签名： 吴志坚

许可开始工作时间： 2024年08月03日06时28分

9. 确认工作负责人布置的工作任务和安全措施：

工作班组人员签名：

郭伟伟, 罗国君, 朱利雄, 胡涛, 程波, 杨福坤, 卿海强, 徐登华, 吕子强, 林金生, 吕建仁, 梁慧, 周斌, 王林, 梅应平

10. 工作负责人变动:原工作负责人 / 离去, 变更 / 为工作负责人

工作票签发人签名： / / 年 / 月 / 日 / 时 / 分

工作票签发人签名： / / 年 / 月 / 日 / 时 / 分

11. 工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间)：

变动类型 (未到、离去、新增)	人员姓名	变动时间	工作负责人
新增	程波	2024年08月03日06时39分	刘洪林

变电站(发电厂)第一种工作票

单位：变电检修(调试)公司

编号：金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

新增	杨福坤	2024年08月03日06时40分	刘洪林
新增	卿海强	2024年08月03日06时41分	刘洪林
新增	徐登华	2024年08月03日06时42分	刘洪林
离去	程波	2024年08月03日07时11分	刘洪林
新增	吕子强	2024年08月03日10时08分	刘洪林
新增	林金生	2024年08月03日10时39分	刘洪林
新增	吕建仁	2024年08月03日10时45分	刘洪林
新增	梁慧	2024年08月03日10时46分	刘洪林
新增	周斌	2024年08月03日11时10分	刘洪林
新增	王林	2024年08月03日11时11分	刘洪林
新增	梅应平	2024年08月03日11时11分	刘洪林
离去	杨福坤	2024年08月03日13时17分	刘洪林
离去	卿海强	2024年08月03日13时17分	刘洪林
离去	徐登华	2024年08月03日13时17分	刘洪林
离去	吕子强	2024年08月04日08时28分	刘洪林

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司

编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

离去	吕建仁	2024年08月04日08时28分	刘洪林
离去	梁慧	2024年08月04日08时28分	刘洪林
离去	周斌	2024年08月04日08时28分	刘洪林
离去	王林	2024年08月04日08时28分	刘洪林
离去	梅应平	2024年08月04日08时28分	刘洪林
离去	林金生	2024年08月04日08时28分	刘洪林

12. 工作票延期:有效期延长至 / 年 / 月 / 日 / 时 / 分

工作负责人签名: / / 年 / 月 / 日 / 时 / 分

工作许可人签名: / / 年 / 月 / 日 / 时 / 分

13. 每日开工收工时间(使用一天的工作票不必填写)

收工时间	工作负责人	工作许可人	开工时间	工作负责人	工作许可人
2024年08月03日20时34分	刘洪林	李明	2024年08月04日08时14分	刘洪林	邵利民
/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分	/	/	/ 年 / 月 / 日 / 时 / 分	/	/

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司
编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

14. 工作终结:全部工作于 2024年08月04日10时10分 结束，设备及安全措施已恢复到开工前状态，工作人员已全部撤离，工具材料已清理完毕，工作已终结

工作负责人签名： 刘洪林 工作许可人签名： 邵利民

15. 工作票终结:临时遮拦、标示牌已拆除，常设遮拦已恢复。

接地线编号 / 等共 0 组、接地刀闸(小车)共 0 副
(台)已拆除或拉开。

保留接地线编号： / 等共 0 组、接地刀闸(小车)共 2
副(台)未拆除或未拉开，已汇报调度值班员。

工作许可人签名： 邵利民 2024年08月04日10时11分

16. 备注：

16.1 指定专责监护人

指定专责监护人杨福坤负责监护郭伟伟, 罗国君, 朱利雄, 卿海强, 徐登华, 胡涛等人在5021开关间隔进行5021开关C相机构更换。监护开始时间：2024年08月03日06时51分。监护结束时间：
2024年08月04日12时00分。

变电站(发电厂)第一种工作票

单位： 变电检修(调试)公司


编号： 金华-永康变-2024-08-B I -001(数)

指定专责监护人吕子强负责监护周斌,王林,梅应平等人在5021开关间隔进行5021开关试验。监护开始时间：2024年08月03日11时40分。监护结束时间：2024年08月03日17时40分。

16.2 其他事项(可附页):

/

简图： 共 2 付(组)地线（或地刀）

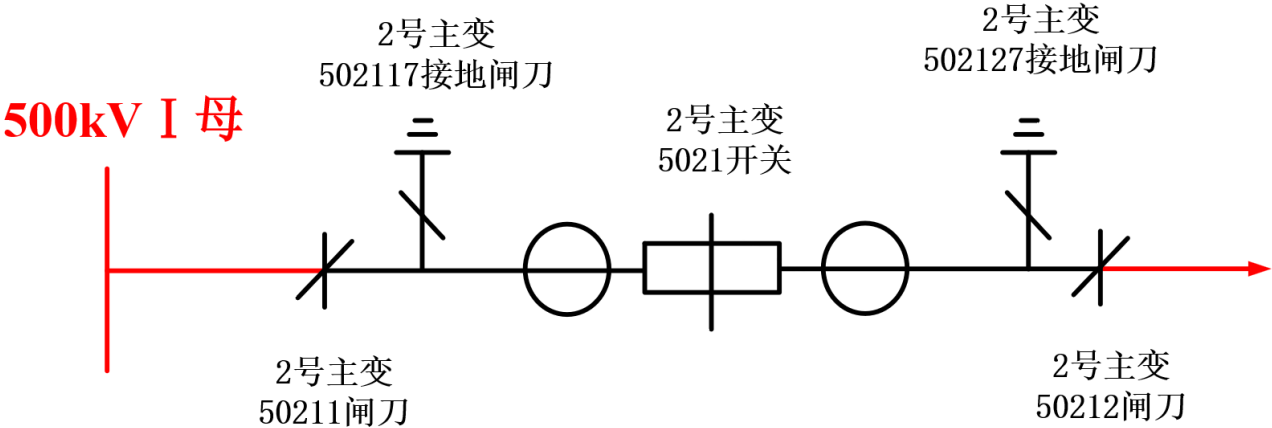

附页

工作班组人员签名:

							
郭伟伟	罗国君	朱利雄	胡涛	程波	杨福坤	卿海强	徐登华
							
吕子强	林金生	吕建仁	梁慧	周斌	王林	梅应平	
